


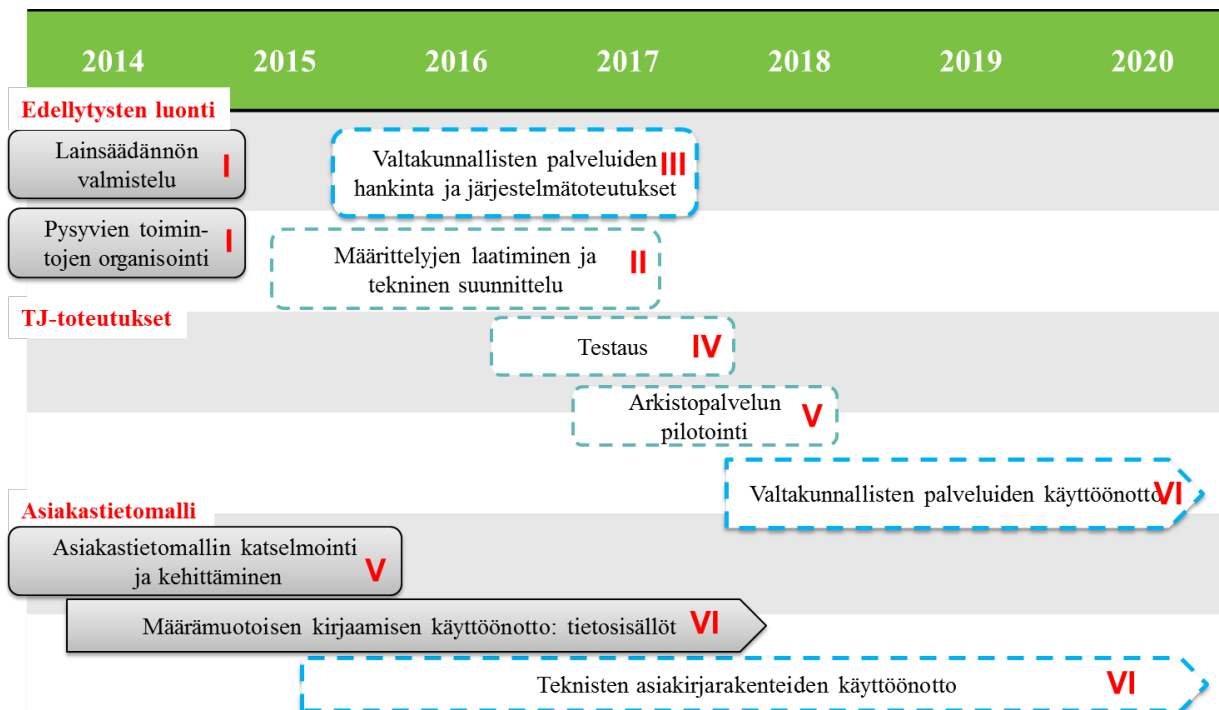

Vaihe

Kehittämiskokonaisuus
Tehtävät

Arvioitu
toteutus-
ajankohta

1 Perusedellytysten luonti		
Lainsäädännön muutokset		
Tarvittavien lakimuutosten valmistelu		2014–2015
Arkkitehtuurin määrittely		2014–2015
Sosiaalihuollon valtakunnallisen tietojärjestelmäpalvelukokonaisuuden toiminnallisuuksien ja päävaatimusten kuvaaminen		2015
Pysyvien toimintojen organisointi		
Sopiminen valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurityön ja siihen liittyvien työryhmien käytöstä Kansa-hankkeessa		2015
Hankkeen päätöksentekomallin suunnittelu, hyväksyntä ja toimeenpano		2014
Toimeenpanorakenteiden suunnittelu		2015
Kansa-hankkeen arviointi tietohallintolain edellyttämällä tavalla		2014
2 Määrittelyjen laatiminen ja tekninen suunnittelu		
Toiminta-arkkitehtuurin määrittely		
Palvelutehtäväkohtaisten toimintaprosessien ja sosiaalipalvelujen luokituksen ylläpito		2014–2015
Käyttötapausten laatiminen		2015
Tiedonhallinnan tukiprosessien mallintaminen		2014–2015
Asiakirjahallinnollisten luokitusten valmistelu		2014–2016
Valtakunnallisesti arkistoitavien asiakirjojen arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen		2015
Tietoarkkitehtuurin määrittely		
Sosiaalihuollon käsitemallin laatiminen		2015
Sisällöllisten asiakirjarakenteiden, luokitusten ja koodistojen valmistelu ja julkaisu koodistopalvelussa (versiot 1.0)		2014–2016
Asiakastietomallin hallintaympäristön suunnittelu ja toteutus		2014–2015
Asiakastietomallin testaus- ja kommentointiympäristön suunnittelu ja toteuttaminen		2015
Teknisten asiakirjamallien (-rakenteiden) suunnittelu ja julkaisu		2014–2015
Metatietomäärittelyjen päivittäminen ja julkaisu		2015
Järjestelmäarkkitehtuurin määrittely		
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ratkaisuarkkitehtuurin määrittely		2014–2015
Kansallisesti määriteltävien ja toteutettavien palvelujen määrittely		2015–2016
Kansallisesti määriteltävien ja alueellisesti/paikallisesti toteutettavien palveluiden määrittelyt		2015–2016
Liittyvien tietojärjestelmien teknisten ja toiminnallisten vaatimusten kokoaminen auditointivaatimuksiin		2015

Teknologia-arkkitehtuurin määrittely	
Sosiaalihuollon asiakirjastandardin kehittäminen	2014–2015
Standardisalkun päivittäminen ja ylläpito	jatkuva
Teknisten määritysten kehittäminen ja yhteensovittaminen terveydenhuollon toimintaan ja kansalliseen palveluarkkitehtuuriin	jatkuva
Tekninen suunnittelu	
Valtakunnallisen arkiston ja tarvittavien tietojärjestelmien toiminnallisuuksia tukevan teknisen ympäristön suunnittelu	2014–2015
Valtakunnallisen arkiston ja tarvittavien tietojärjestelmien teknisen toteutusympäristön määrittely	2015–2016
3 Valtakunnallisten palveluiden hankinta ja järjestelmätoteutukset	
Valtakunnallisen arkiston ja siihen liittyvien tietojärjestelmäpalvelujen hankinta	
Hankintojen valmistelu	2015
Hankintojen toteutus	2016
Hallintorakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen	
Teknisen toimintaympäristön rakentaminen	2015
Testaus-, pilotointi- ja käyttöönottoavaiheiden toimintaedellytysten luonti	2016
4 Testaus	
Testaaminen	
Auditointi- ja hyväksymismenettelystä sopiminen	2016
Auditointi- ja hyväksymiskriteerien määrittely	2016
Testaussuunnitelman laatiminen	2016
Arkistopalvelun testaus	2016
Liittyvän järjestelmän testaus arkistopalveluun	2017
Testausta koskevien ohjeiden määrittely osana liittymismalleja	2017
5 Pilotointi	
Asiakastietomallin pilotointi	
Mallinnusvirheiden poistaminen asiakastietomallista	2014–2015
Saada käyttäjäpalautetta toiminta- ja tietomäärityksien kehittämiseksi tarvetta vastaavaksi	2014–2016
Toteuttaa ja tukea käyttöönottoihin tähtääviä projekteja	2014–2016
Saada käyttöönottojen tueksi koulutusmateriaalia ja käyttöönottomalleja	2014–2016
Tekninen pilotointi	
Teknisten asiakirjarakenteiden koekäyttö liittyvässä järjestelmässä	2017
Valtakunnallisen arkiston koekäyttö tuotantojärjestelmällä	2017
Valtakunnallisen varmennepalvelun koekäyttö sosiaalihuollossa	2017
Asiakirjan tallentaminen ja hakeminen arkistossa	2017
Asiakirjan palauttaminen arkistopalvelusta Omakantaan	2017
Asiakirjan tietosisällön poiminta kooste-asiakirjaan ja palautus sosiaalihuollon tiedonhallintapalveluun?	2017
6 Käyttönotot	
Käyttöönottosuunnitelmien laatiminen	
Asiakirjarakenteiden käyttöönottoa tukevat koulutusaineisto ja toimintamallit	2016
Toimintamallit arkistopalvelun käyttöönottoon	2017
Käyttöönottoa tukevat valtakunnalliset suunnitelmat	2016
Käyttöönottoa tukevat paikalliset tai alueelliset suunnitelmat	2016 alkaen
Alueellisten tukiorganisaatioiden rakentaminen	2016 alkaen
Valtakunnallisen tukiorganisaation rakentaminen (vrt. VIILA ym., ja OPER erikoissuunnittelijat)	2016 alkaen
Valtakunnallisen viestintärakenteen luominen (vrt. Kelan rooli kansalaisviestinnässä)	2016 alkaen
Valtakunnallisten tukimateriaalien toteuttaminen (vrt. verkkokoulut, toimintamallikoulutukset)	2016 alkaen
Organisaatioiden käyttöönotot	
Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tuki ja ohjaaminen	2015 alkaen
Liittyvien organisaation itseauditoinnin tukeminen	2017
Liittyvien organisaatioiden toimintamallikoulutukset	2016 alkaen
Tietojärjestelmätoimittajien tukeminen	2016 alkaen
Liittyvien organisaatioiden käyttöönottokokoukset	2017 alkaen
Paikallisten ja alueellisten koulutusten tukeminen	2017 alkaen
Paikallisen ja alueellisen viestinnän tuki	2016 alkaen
7 Hankkeen päättäminen	
Kehittämiskokonaisuus x	
Muutoshallinnan suunnittelu, organisointi ja toimeenpano	
Tuotantokäyttöön siirtyminen hallitusti	
Hankerakenteen purkaminen ja pysyviin toimintoihin siirtyminen	
Jatkokehitystarpeiden tunnistaminen	
Seuranta- ja ylläpitomallista sopiminen	
